Voorbereidingsplanning_hoofdlijnen 110 Morgen - Rotterdam

Concept

Opdrachtgever: DVBZW - Habion

DURA VERMEER
Waarmaken van ambities
Dura Vermeer Bouw Zuid West
Rotterdam Airportplein 21
Postbus 1986 3000 BZ Rotterdam
T (010) - 280 85 00
F (010) - 280 85 01

Project	Voorbereidingsplanning_hoofdlijnen 110 Morgen - Rotterdam
Opdrachtgever	DVBZW - Habion
Omschrijving	
Projectnr.	
Documentnr.	
Getekend	G. Stolwijk
Gecontr.	G. Stolwijk
Datum	15-12-2022
Gewijzigd	wijz. 1.1
Status	Concept

		Jaarkalender	Duur	Start
		MIJLPALEN		
+	1	Ondertekenen Ontwikkelovereenkomst Habion-DV		22-12-2022
+	2	Ingang BBL / Omgevingswet		30-6-2023
+	3	Indienen Omgevingsvergunning		29-6-2023
+	4	1e mogelijkheid onherroepelijke vergunning (bij geen beroep)		7-2-2024
+	5	Gunning: TKO ondertekenen		14-2-2024
+	6	Start bouw		19-2-2024
+	7	**1. STUCTUUR ONTWERP**	81d	29-8-2022
+	8	**2. VOOR ONTWERP**	90d	7-11-2022
+	9	**3a. DEFINITIEF ONTWERP**	100d	13-2-2023
+	10	**3c. VERGUNNING**	35d	12-5-2023
+	11	**4. TECHNISCH ONTWERP**	70d	3-7-2023
+	12	**5. UITVOERINGS GEREED ONTWERP**	96d	9-10-2023

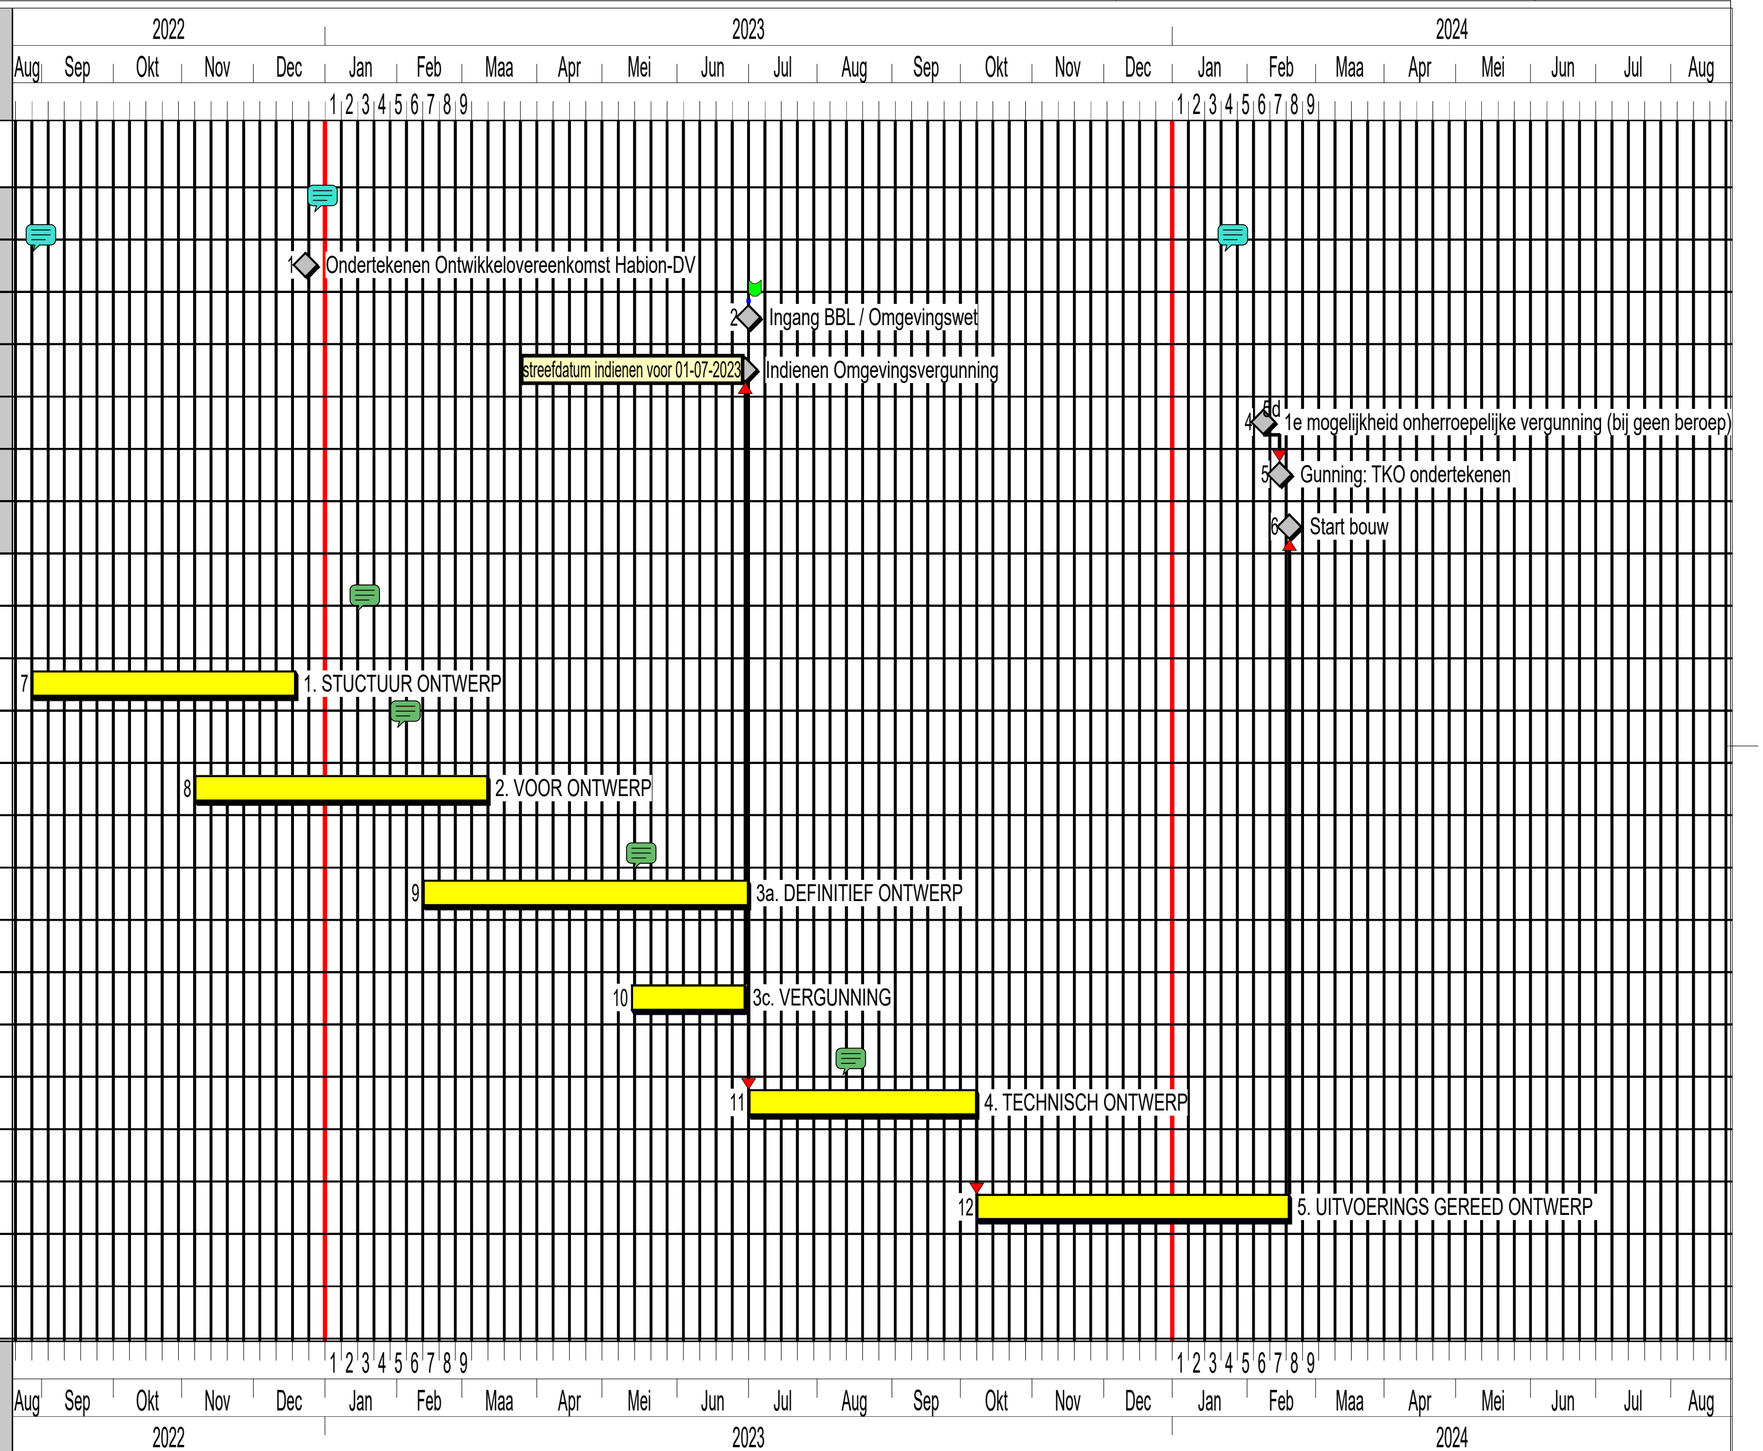

Mijlpaalweergaven

Ruit

Printdatum: 16-12-2022
